

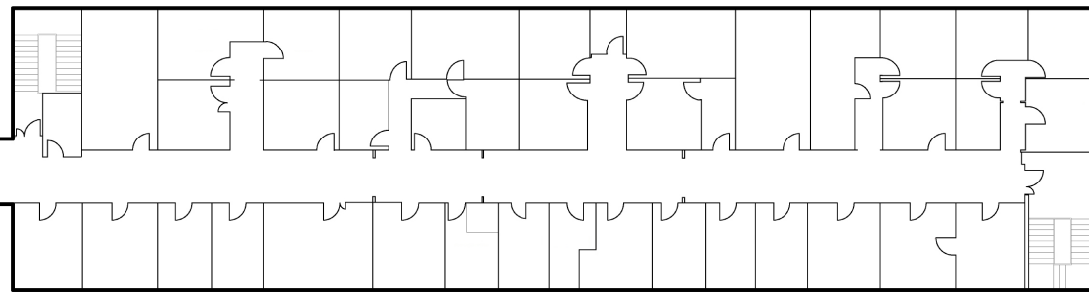
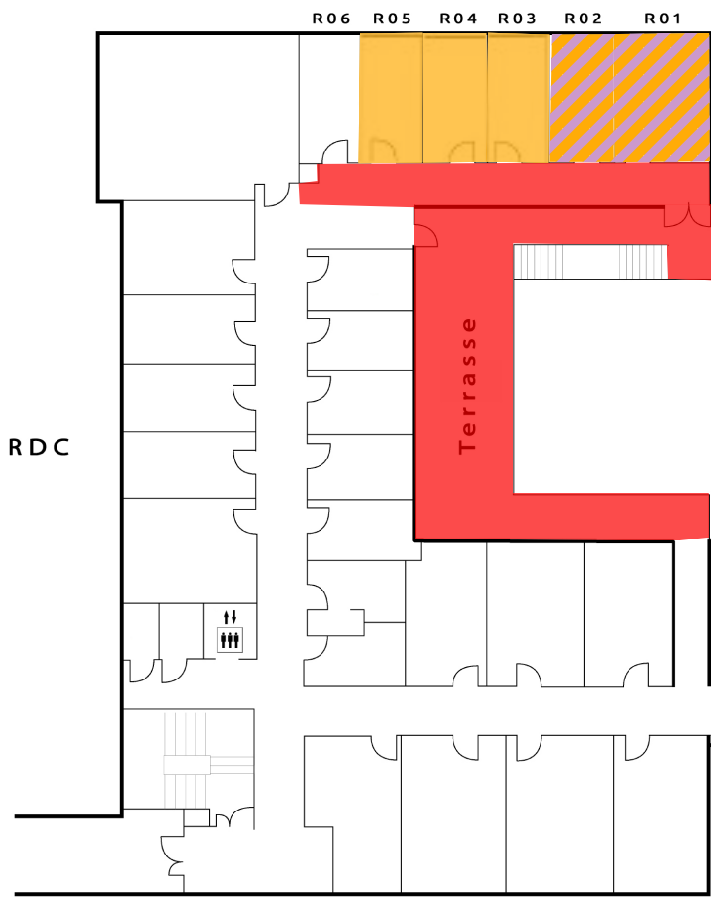
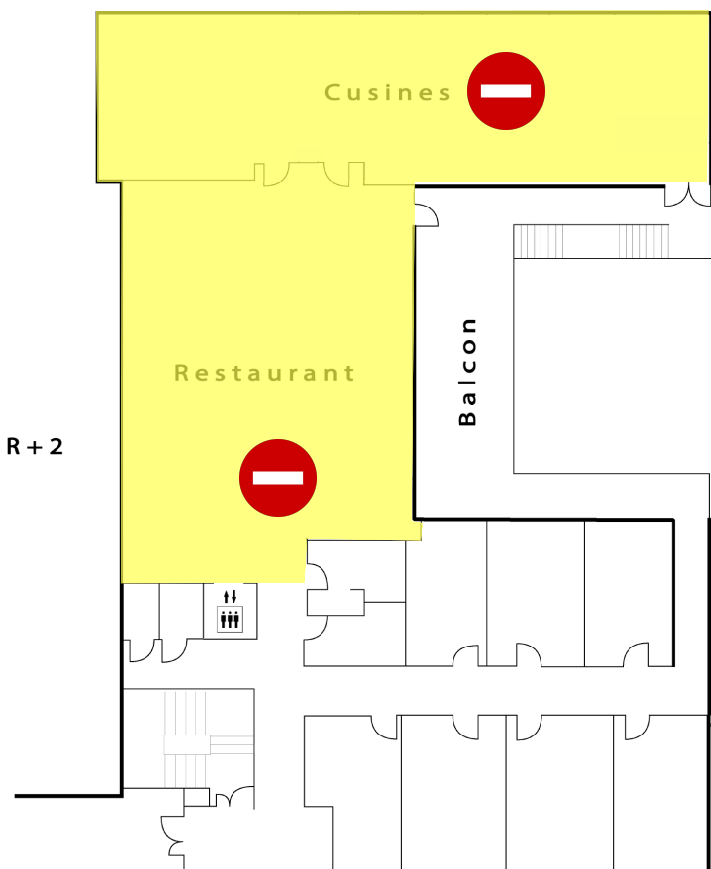


2020																																																																																																																																																																		
Septembre				Octobre				Novembre																																																																																																																																																										
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom (PM)</th> <th>Début (PM)</th> <th>Fin (PM)</th> <th colspan="12">2020</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th colspan="12">Septembre</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>A</th><th>S</th><th>D</th><th colspan="5"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etage 0</td> <td></td> <td></td> <td colspan="12">[Gantt bars for Etage 0]</td> </tr> <tr> <td>R01</td> <td>07/09/2020 08:00</td> <td>07/09/2020 16:00</td> <td colspan="12">[Gantt bar for R01]</td> </tr> <tr> <td>R02</td> <td>08/09/2020 08:00</td> <td>09/09/2020 16:00</td> <td colspan="12">[Gantt bar for R02]</td> </tr> <tr> <td>R03</td> <td>09/09/2020 08:00</td> <td>11/09/2020 16:00</td> <td colspan="12">[Gantt bar for R03]</td> </tr> <tr> <td>R04</td> <td>09/09/2020 08:00</td> <td>09/09/2020 16:00</td> <td colspan="12">[Gantt bar for R04]</td> </tr> <tr> <td>R05</td> <td>10/09/2020 08:00</td> <td>10/09/2020 16:00</td> <td colspan="12">[Gantt bar for R05]</td> </tr> <tr> <td>R06</td> <td>11/09/2020 08:00</td> <td>11/09/2020 16:00</td> <td colspan="12">[Gantt bar for R06]</td> </tr> </tbody> </table>												Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020															Septembre															L	M	M	J	V	A	S	D						Etage 0			[Gantt bars for Etage 0]												R01	07/09/2020 08:00	07/09/2020 16:00	[Gantt bar for R01]												R02	08/09/2020 08:00	09/09/2020 16:00	[Gantt bar for R02]												R03	09/09/2020 08:00	11/09/2020 16:00	[Gantt bar for R03]												R04	09/09/2020 08:00	09/09/2020 16:00	[Gantt bar for R04]												R05	10/09/2020 08:00	10/09/2020 16:00	[Gantt bar for R05]												R06	11/09/2020 08:00	11/09/2020 16:00	[Gantt bar for R06]											
Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020																																																																																																																																																															
			Septembre																																																																																																																																																															
			L	M	M	J	V	A	S	D																																																																																																																																																								
Etage 0			[Gantt bars for Etage 0]																																																																																																																																																															
R01	07/09/2020 08:00	07/09/2020 16:00	[Gantt bar for R01]																																																																																																																																																															
R02	08/09/2020 08:00	09/09/2020 16:00	[Gantt bar for R02]																																																																																																																																																															
R03	09/09/2020 08:00	11/09/2020 16:00	[Gantt bar for R03]																																																																																																																																																															
R04	09/09/2020 08:00	09/09/2020 16:00	[Gantt bar for R04]																																																																																																																																																															
R05	10/09/2020 08:00	10/09/2020 16:00	[Gantt bar for R05]																																																																																																																																																															
R06	11/09/2020 08:00	11/09/2020 16:00	[Gantt bar for R06]																																																																																																																																																															


01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN

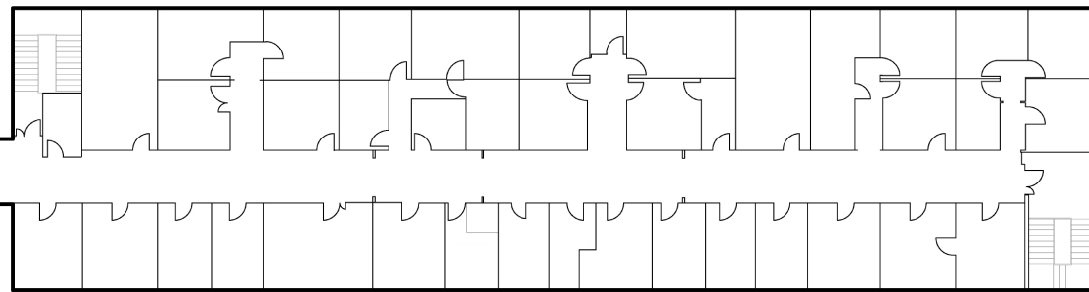

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020												
			Septembre												
			L	M	M	J	V	A	S	D					
[Gantt bar for R01]															

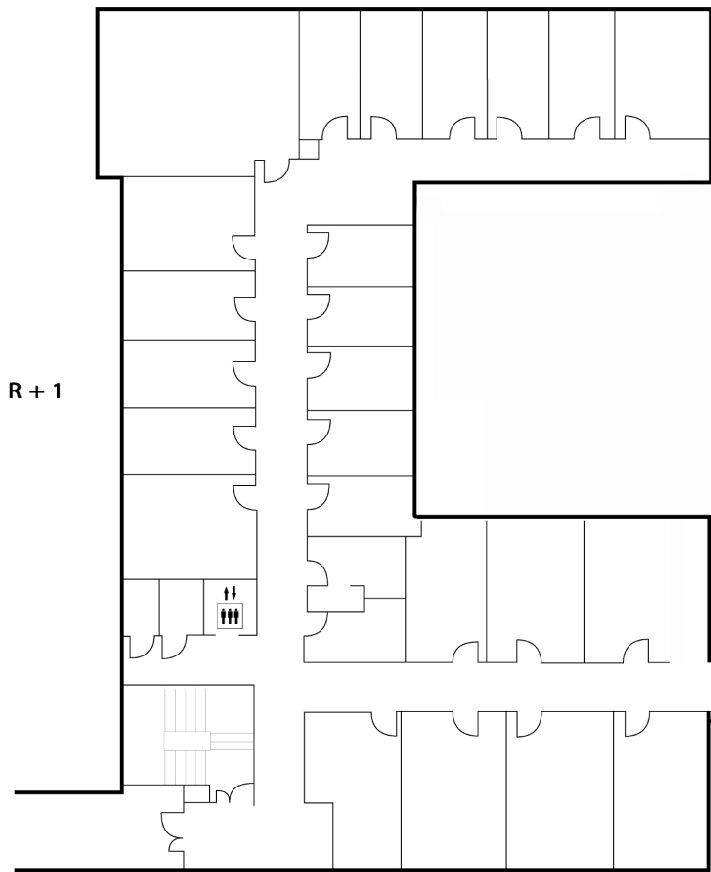


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020												
			Septembre												
			L	M	M	J	V	A	S	D					
Etage 2			[Gantt bars for Etage 2]												
Cusines			[Gantt bars for Cusines]												
Mise aux normes	07/09/2020 08:00	11/09/2020 16:00	[Gantt bar for Mise aux normes]												
Restaurant			[Gantt bars for Restaurant]												
Mise aux normes	07/09/2020 08:00	11/09/2020 16:00	[Gantt bar for Mise aux normes]												

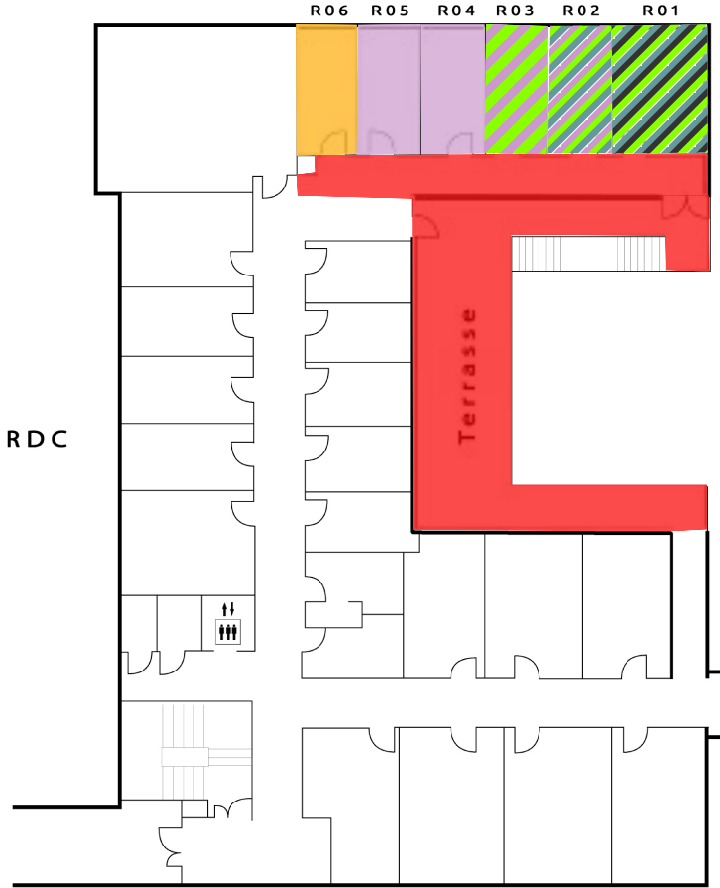


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre						
			L	M	M	J	V	S	D
A	Etage 0								
R01	Pose des Revêtements au sol								
	14/09/2020 08:00	14/09/2020 16:00							
	15/09/2020 08:00	16/09/2020 16:00							
	17/09/2020 08:00	21/09/2020 16:00							
R03	Reprise des murs								
	14/09/2020 08:00	15/09/2020 16:00							
	16/09/2020 08:00	17/09/2020 16:00							
	18/09/2020 08:00	18/09/2020 16:00							
R02	Peinture								
	14/09/2020 08:00	15/09/2020 16:00							
	16/09/2020 08:00	17/09/2020 16:00							
	17/09/2020 08:00	18/09/2020 16:00							
R06	Dépose Mobilier + moquette								
	14/09/2020 08:00	14/09/2020 16:00							
R04	Reprise des murs								
	16/09/2020 08:00	17/09/2020 16:00							
	18/09/2020 08:00	21/09/2020 16:00							
R05	Plomberie/Sanitaires								
	17/09/2020 08:00	18/09/2020 16:00							
R03	Reprise des murs								
	18/09/2020 08:00	21/09/2020 16:00							

01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN

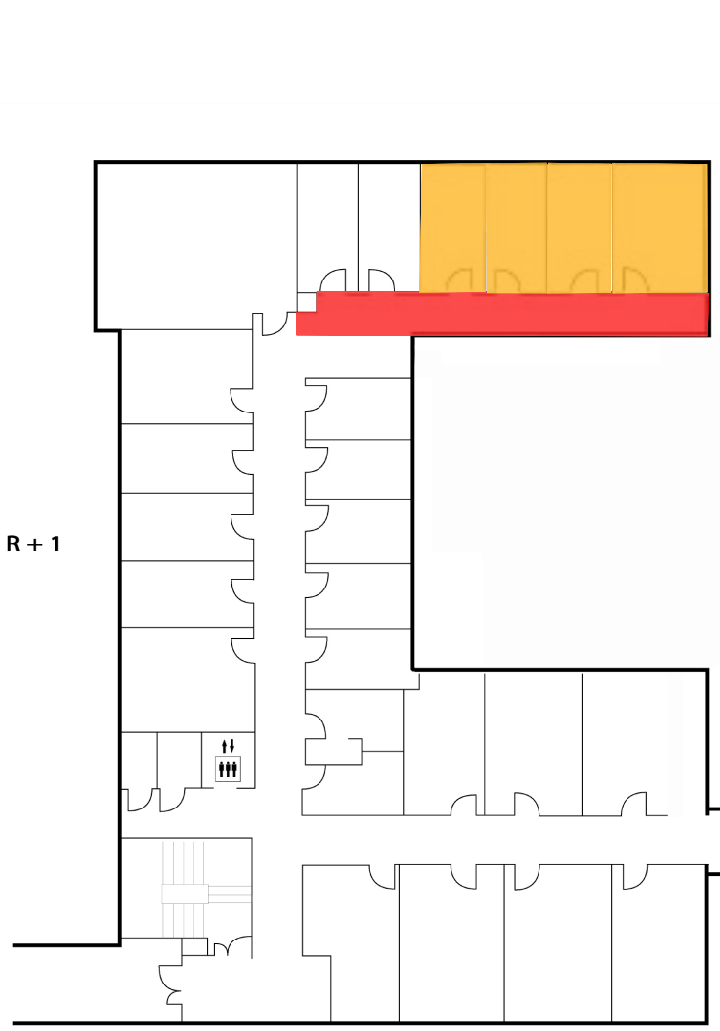


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre						
			L	M	M	J	V	S	D
A	Etage 1								
R01	Dépose Mobilier + moquette								
	15/09/2020 08:00	15/09/2020 16:00							
R02	Dépose Mobilier + moquette								
	16/09/2020 08:00	16/09/2020 16:00							
R03	Dépose Mobilier + moquette								
	17/09/2020 08:00	17/09/2020 16:00							
R04	Dépose Mobilier + moquette								
	18/09/2020 08:00	18/09/2020 16:00							

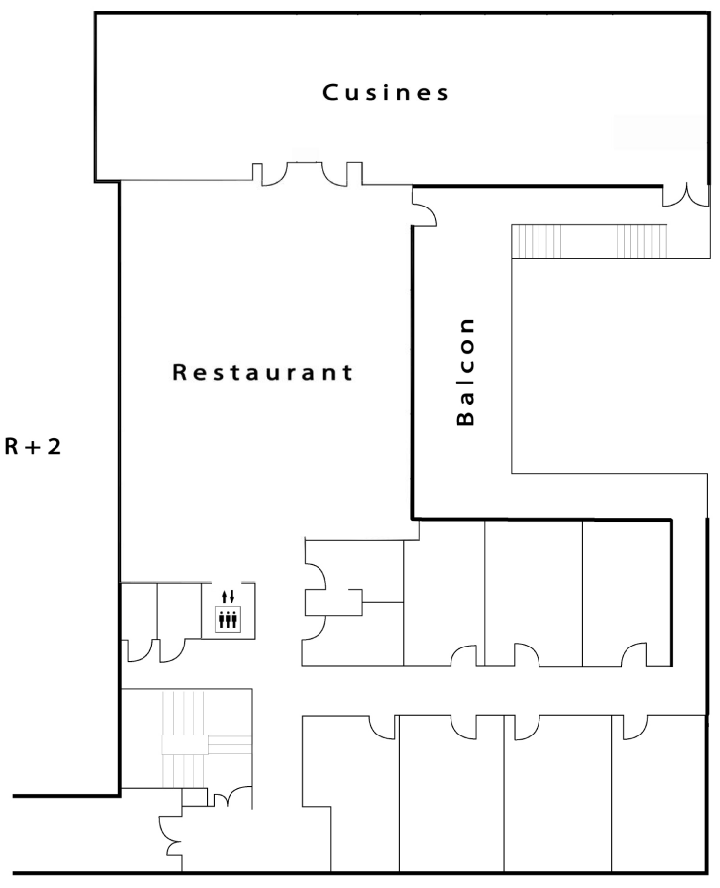



Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre						
			L	M	M	J	V	S	D

		2020			2020			2020			
		Septembre			Octobre			Novembre			
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		L M M J V S D			L M M J V S D			L M M J V S D			
		A			A			A			
Etage 0		R01			R01			R01			
Elec + Equipements		17/09/2020 08:00			21/09/2020 16:00			Elec + Equipements			
R05		Reprise des murs			Reprise des murs			Reprise des murs			
Reprise des murs		18/09/2020 08:00			21/09/2020 16:00			Reprise des murs			
Peinture		22/09/2020 08:00			23/09/2020 16:00			Peinture			
Pose des Revêtements au sol		24/09/2020 08:00			24/09/2020 16:00			Pose des Revêtements au sol			
Plomberie/Sanitaires		25/09/2020 08:00			28/09/2020 16:00			Plomberie/Sanitaires			
R04		Peinture			Peinture			Peinture			
Peinture		18/09/2020 08:00			21/09/2020 16:00			Peinture			
Pose des Revêtements au sol		22/09/2020 08:00			22/09/2020 16:00			Pose des Revêtements au sol			
Plomberie/Sanitaires		23/09/2020 08:00			24/09/2020 16:00			Plomberie/Sanitaires			
Elec + Equipements		25/09/2020 08:00			29/09/2020 16:00			Elec + Equipements			
R03		Plomberie/Sanitaires			Plomberie/Sanitaires			Plomberie/Sanitaires			
Plomberie/Sanitaires		21/09/2020 08:00			22/09/2020 16:00			Plomberie/Sanitaires			
Elec + Equipements		23/09/2020 08:00			25/09/2020 16:00			Elec + Equipements			
R02		Elec + Equipements			Elec + Equipements			Elec + Equipements			
Elec + Equipements		21/09/2020 08:00			23/09/2020 16:00			Elec + Equipements			
R06		Reprise des murs			Reprise des murs			Reprise des murs			
Reprise des murs		22/09/2020 08:00			23/09/2020 16:00			Reprise des murs			
Peinture		24/09/2020 08:00			25/09/2020 16:00			Peinture			



01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN

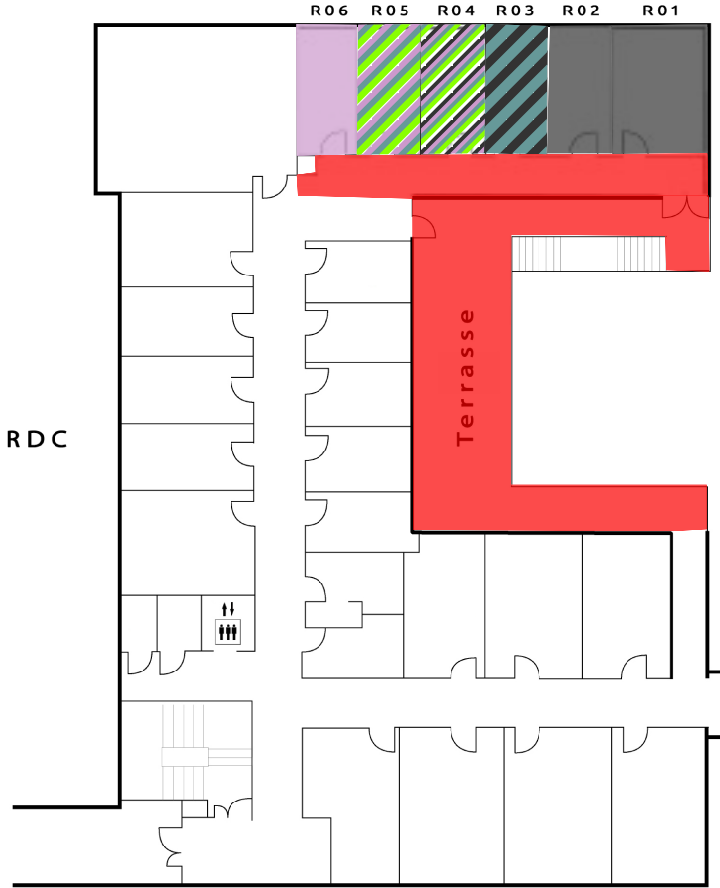


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre						
			37	38	39	40	41	42	43
			L	M	M	J	V	S	D
A			A						
Etage 0			R01						
Elec + Equipements			17/09/2020 08:00						
R05			Reprise des murs						
Reprise des murs			18/09/2020 08:00						
Peinture			22/09/2020 08:00						
Pose des Revêtements au sol			24/09/2020 08:00						
Plomberie/Sanitaires			25/09/2020 08:00						
R04			Peinture						
Peinture			18/09/2020 08:00						
Pose des Revêtements au sol			22/09/2020 08:00						
Plomberie/Sanitaires			23/09/2020 08:00						
Elec + Equipements			25/09/2020 08:00						
R03			Plomberie/Sanitaires						
Plomberie/Sanitaires			21/09/2020 08:00						
Elec + Equipements			23/09/2020 08:00						
R02			Elec + Equipements						
Elec + Equipements			21/09/2020 08:00						
R06			Reprise des murs						
Reprise des murs			22/09/2020 08:00						
Peinture			24/09/2020 08:00						

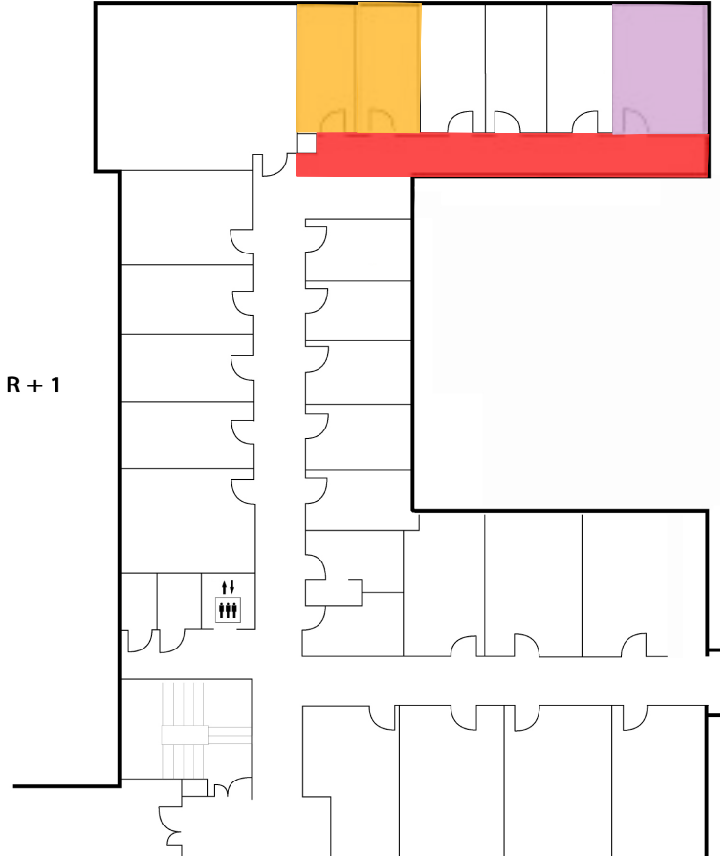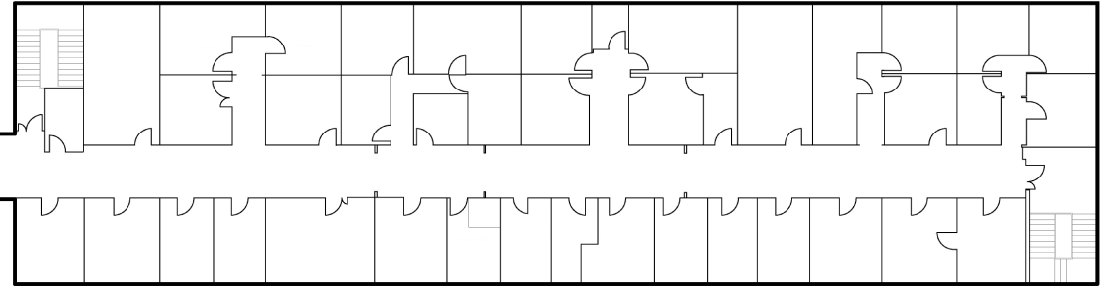

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre						
			37	38	39	40	41	42	43
			L	M	M	J	V	S	D
A			A						
Etage 1			R05						
Dépose Mobilier + moquette			21/09/2020 08:00						
R06			Dépose Mobilier + moquette						
Dépose Mobilier + moquette			22/09/2020 08:00						
R01			Reprise des murs						
Reprise des murs			24/09/2020 08:00						
B			B						
Etage 1			Suite 01						
Suite 01			Dépose Cloisons + Mobilier + moquette + portes						
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette			23/09/2020 08:00						
Suite 02			Dépose Cloisons + Mobilier + moquette						
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette			25/09/2020 08:00						

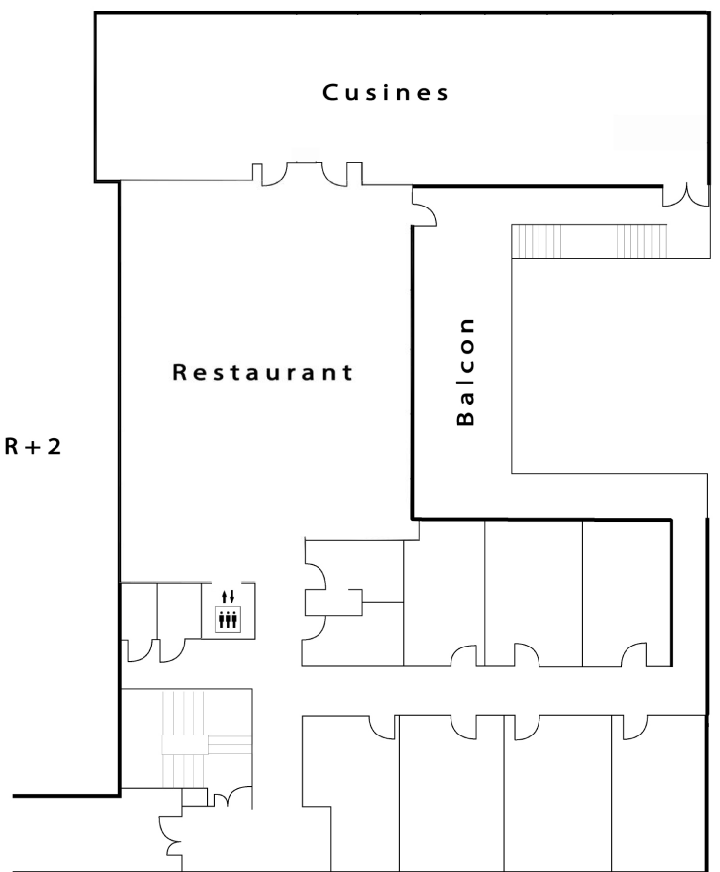
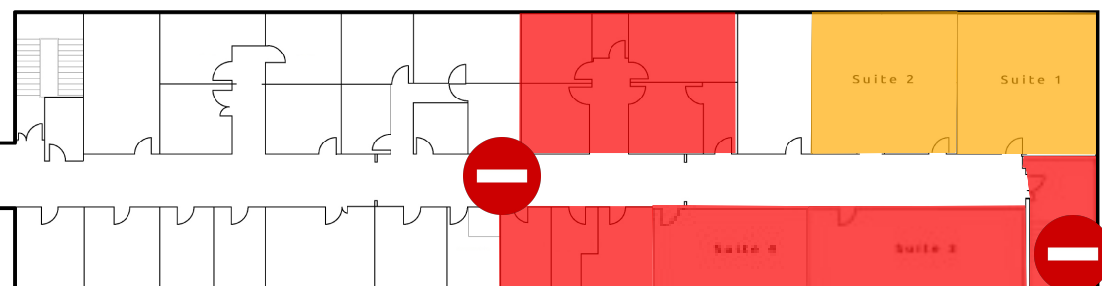


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre						
			37	38	39	40	41	42	43
			L	M	M	J	V	S	D


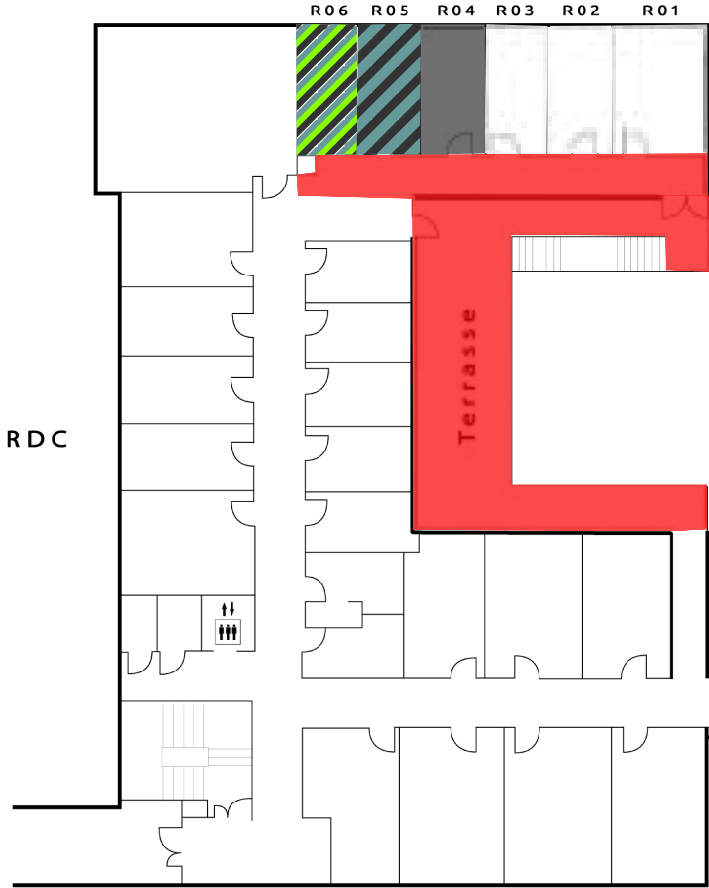


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre			Octobre			
			L	M	M	J	V	S	D
Etage 0			[Gantt bars for Etage 0]						
R05			[Gantt bars for R05]						
Plomberie/Sanitaires	25/09/2020 08:00	28/09/2020 16:00	[Gantt bars for Plomberie/Sanitaires]						
Elec + Equipements	29/09/2020 08:00	01/10/2020 16:00	[Gantt bars for Elec + Equipements]						
R04			[Gantt bars for R04]						
Elec + Equipements	25/09/2020 08:00	29/09/2020 16:00	[Gantt bars for Elec + Equipements]						
R06			[Gantt bars for R06]						
Pose des Revêtements au sol	28/09/2020 08:00	28/09/2020 16:00	[Gantt bars for Pose des Revêtements au sol]						
Plomberie/Sanitaires	29/09/2020 08:00	30/09/2020 16:00	[Gantt bars for Plomberie/Sanitaires]						
Elec + Equipements	01/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00	[Gantt bars for Elec + Equipements]						

[Orange]	01 - Dépose Mobilier + moquette
[Purple]	02 - Plâtre + Ponçage
[Green]	03 - Peinture
[Light Green]	04 - Revêtements au sol
[Dark Green]	05 - Plomberie/Sanitaires
[Yellow]	06 - Elec + Equipements
[White]	MIN

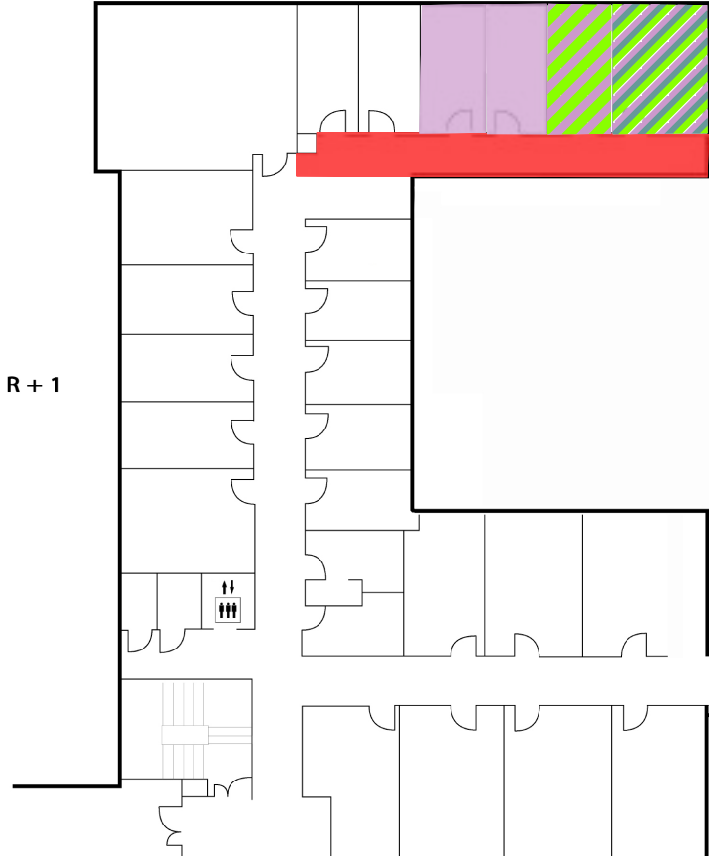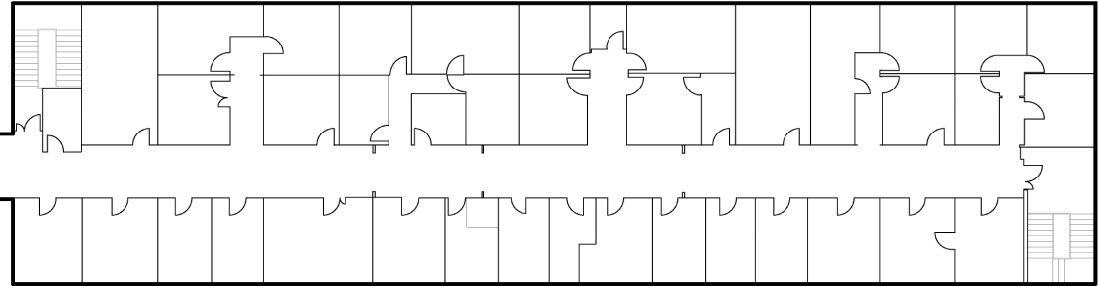


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre			Octobre			
			L	M	M	J	V	S	D
Etage 1			[Gantt bars for Etage 1]						
Suite 02			[Gantt bars for Suite 02]						
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	25/09/2020 08:00	28/09/2020 16:00	[Gantt bars for Suite 02]						
Suite 03			[Gantt bars for Suite 03]						
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	29/09/2020 08:00	30/09/2020 16:00	[Gantt bars for Suite 03]						
Suite 04			[Gantt bars for Suite 04]						
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	01/10/2020 08:00	02/10/2020 16:00	[Gantt bars for Suite 04]						
Suite 01			[Gantt bars for Suite 01]						
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	01/10/2020 08:00	02/10/2020 16:00	[Gantt bars for Suite 01]						
Reprise des murs	02/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00	[Gantt bars for Suite 01]						
Etage 1			[Gantt bars for Etage 1]						
R01			[Gantt bars for R01]						
Peinture	28/09/2020 08:00	29/09/2020 16:00	[Gantt bars for R01]						
Pose des Revêtements au sol	30/09/2020 08:00	30/09/2020 16:00	[Gantt bars for R01]						
Plomberie/Sanitaires	01/10/2020 08:00	02/10/2020 16:00	[Gantt bars for R01]						
R02			[Gantt bars for R02]						
Reprise des murs	28/09/2020 08:00	29/09/2020 16:00	[Gantt bars for R02]						
Peinture	30/09/2020 08:00	01/10/2020 16:00	[Gantt bars for R02]						
Pose des Revêtements au sol	02/10/2020 08:00	02/10/2020 16:00	[Gantt bars for R02]						
R03			[Gantt bars for R03]						
Reprise des murs	30/09/2020 08:00	01/10/2020 16:00	[Gantt bars for R03]						
Peinture	02/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00	[Gantt bars for R03]						
R04			[Gantt bars for R04]						
Reprise des murs	02/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00	[Gantt bars for R04]						

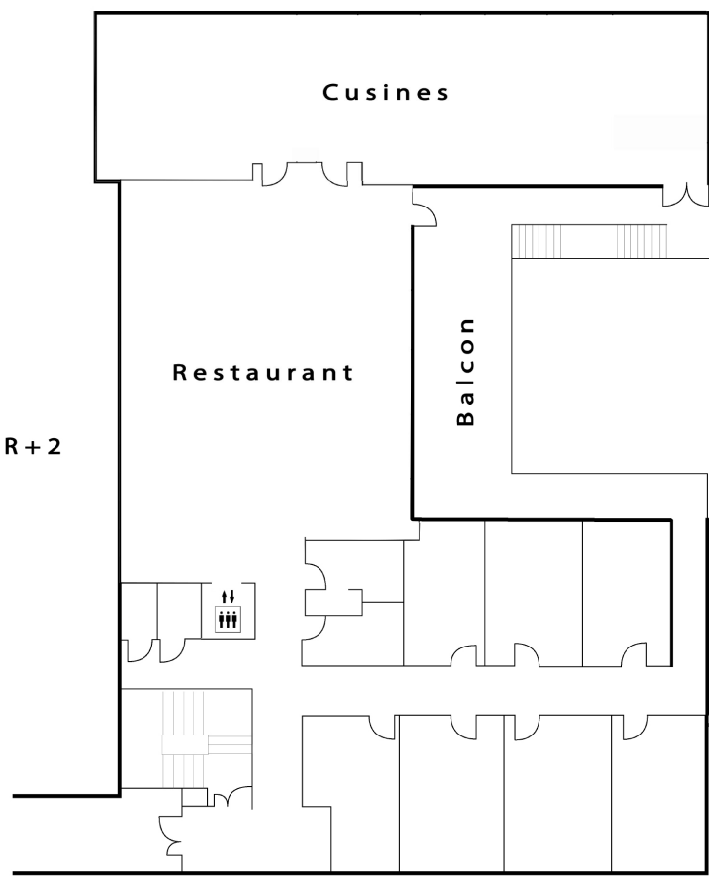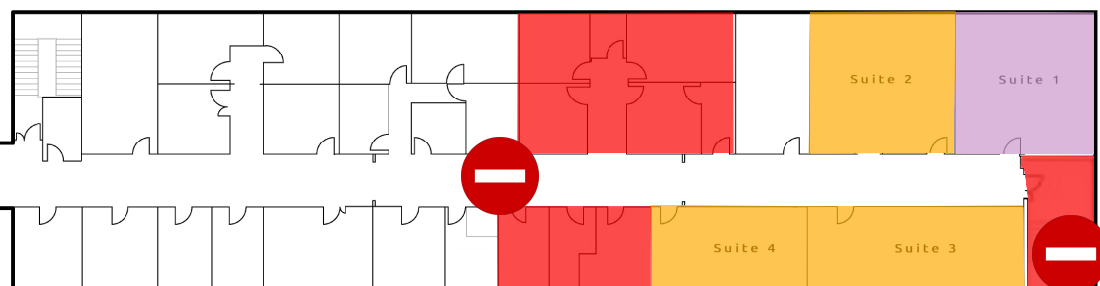



Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Septembre			Octobre			
			L	M	M	J	V	S	D
Etage 2			[Gantt bars for Etage 2]						

2020				2020				2020			
Septembre				Octobre				Novembre			
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
				41							


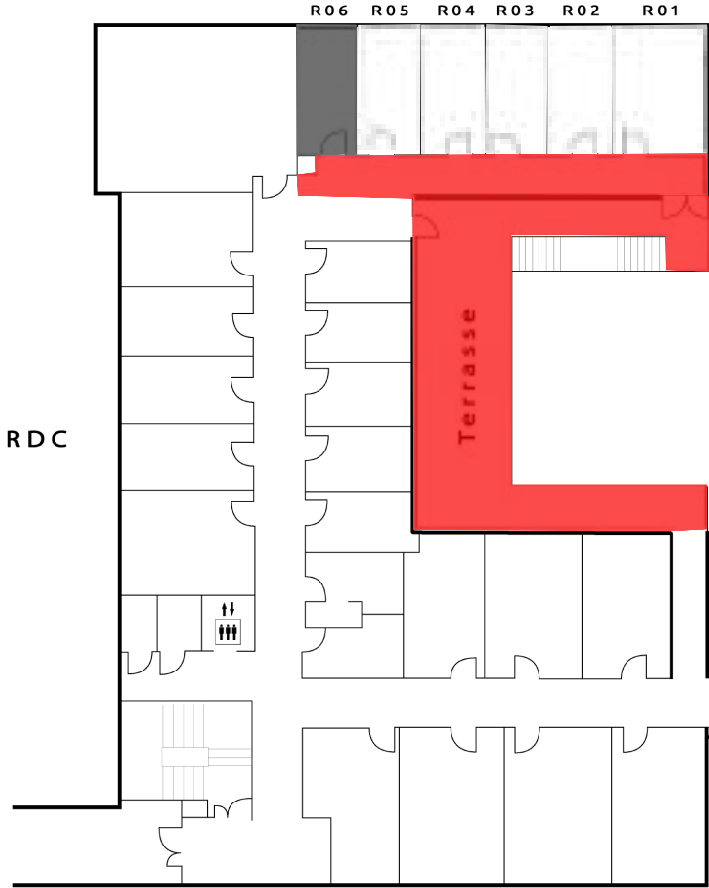


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Octobre						
			L	M	M	J	V	S	D
A									
Etage 0									
R06									
Elec + Equipements	01/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00							

01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN


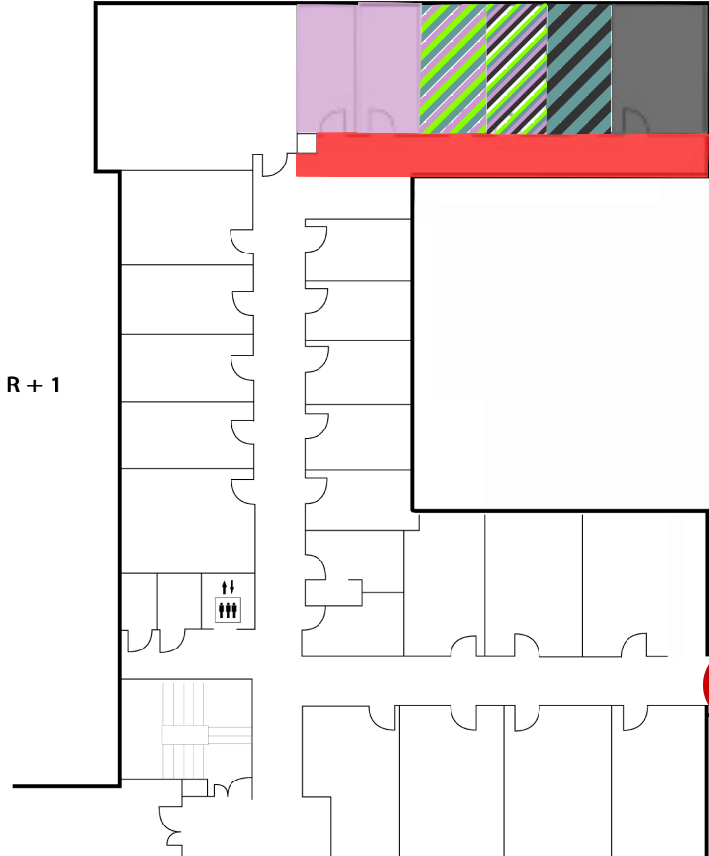
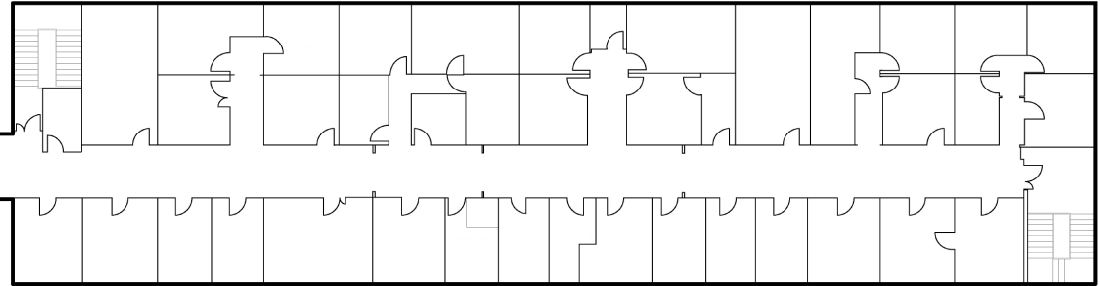


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Octobre						
			L	M	M	J	V	S	D
A									
Etage 1									
R03									
Peinture	02/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00							
Pose des Revêtements au sol	06/10/2020 08:00	06/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	07/10/2020 08:00	08/10/2020 16:00							
Elec + Equipements	09/10/2020 08:00	13/10/2020 16:00							
R04									
Reprise des murs	02/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00							
Peinture	06/10/2020 08:00	07/10/2020 16:00							
Pose des Revêtements au sol	08/10/2020 08:00	08/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	09/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
R01									
Elec + Equipements	05/10/2020 08:00	07/10/2020 16:00							
R02									
Plomberie/Sanitaires	05/10/2020 08:00	06/10/2020 16:00							
Elec + Equipements	07/10/2020 08:00	09/10/2020 16:00							
R05									
Reprise des murs	06/10/2020 08:00	07/10/2020 16:00							
Peinture	08/10/2020 08:00	09/10/2020 16:00							
R06									
Reprise des murs	08/10/2020 08:00	09/10/2020 16:00							
B									
Etage 1									
Suite 01									
Reprise des murs	02/10/2020 08:00	05/10/2020 16:00							
Peinture	06/10/2020 08:00	07/10/2020 16:00							
Pose des Revêtements au sol	08/10/2020 08:00	08/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	09/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
Suite 05									
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	05/10/2020 08:00	06/10/2020 16:00							
Suite 02									
Reprise des murs	06/10/2020 08:00	07/10/2020 16:00							
Peinture	08/10/2020 08:00	09/10/2020 16:00							
Suite 06									
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	07/10/2020 08:00	08/10/2020 16:00							
Suite 03									
Reprise des murs	08/10/2020 08:00	09/10/2020 16:00							
Suite 07									
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	09/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							

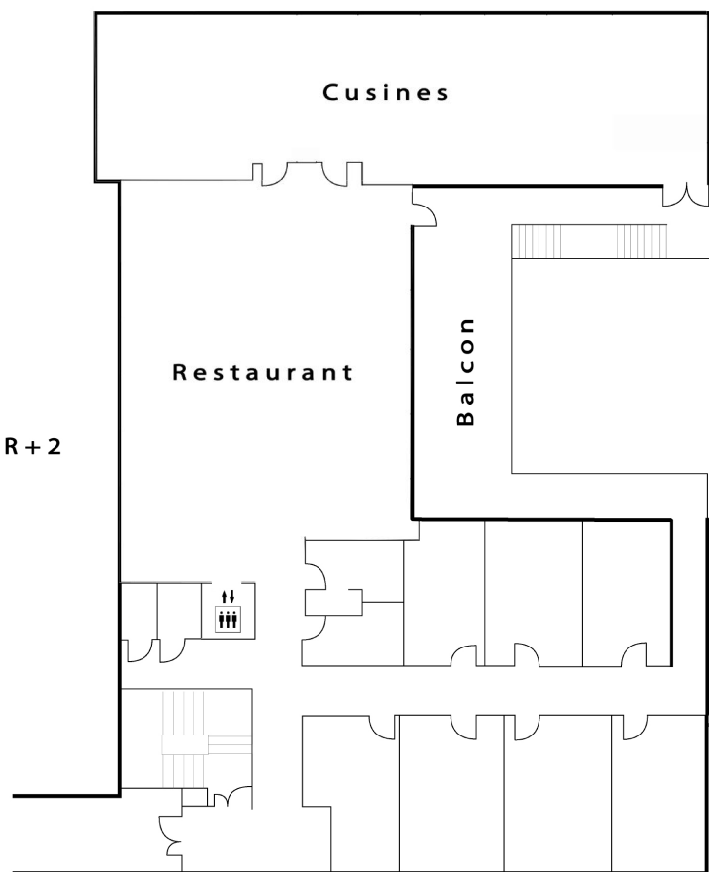
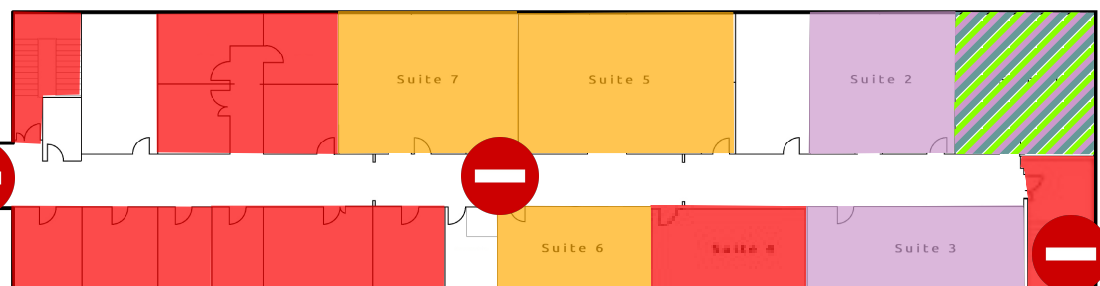


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Octobre						
			L	M	M	J	V	S	D

2020					2020				2020				
Septembre					Octobre				Novembre				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

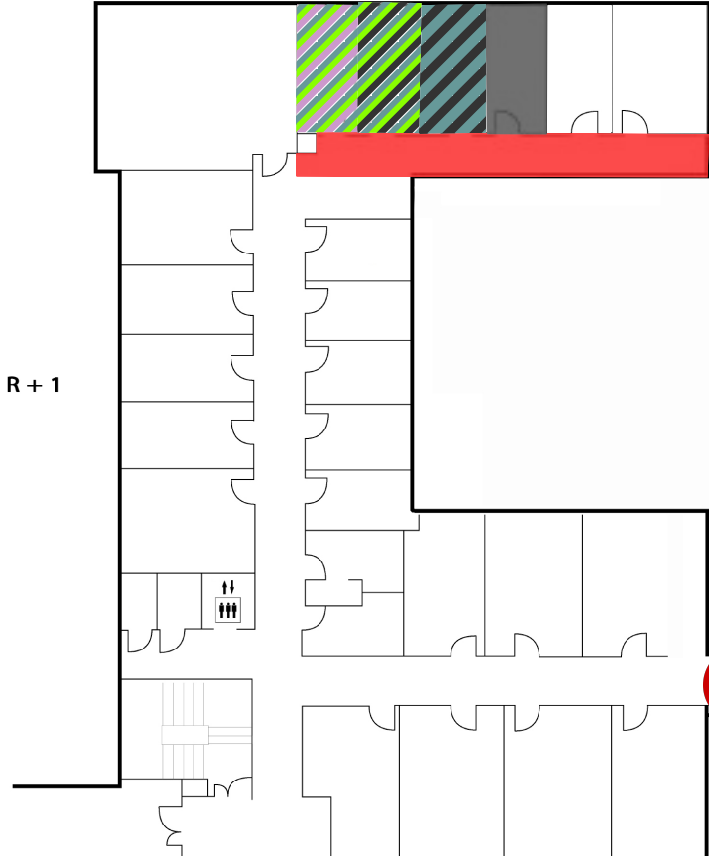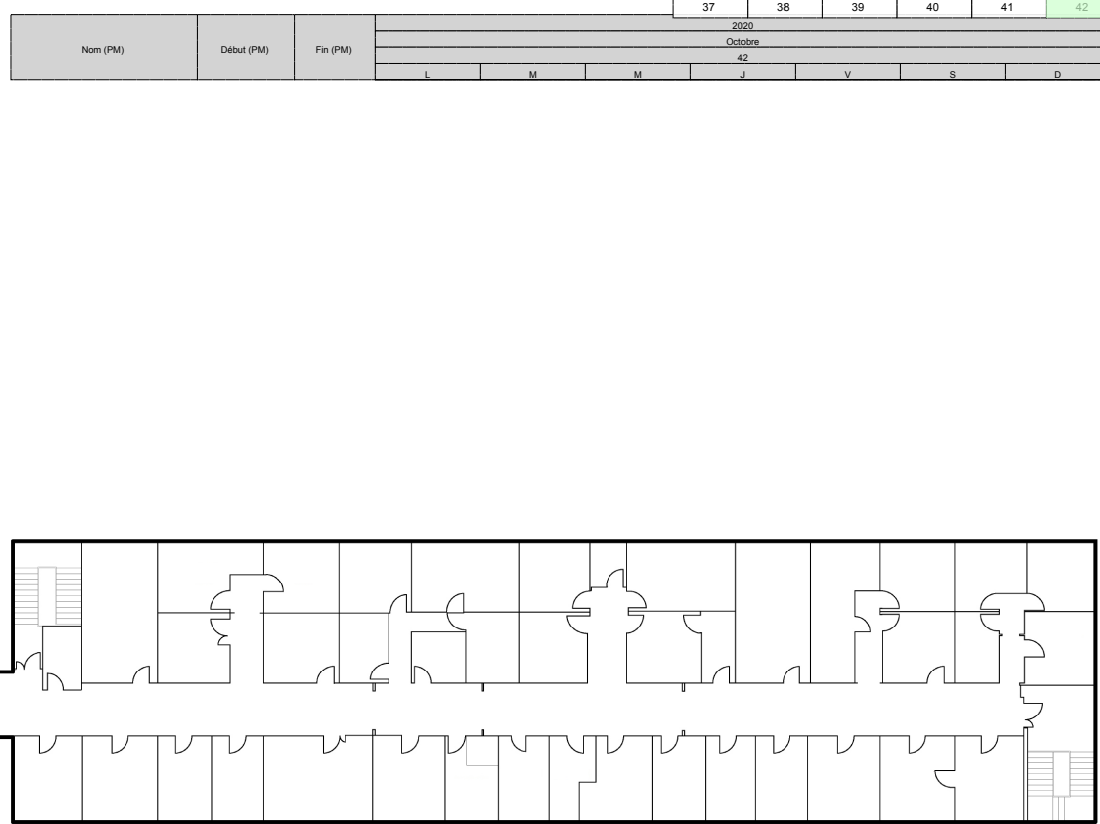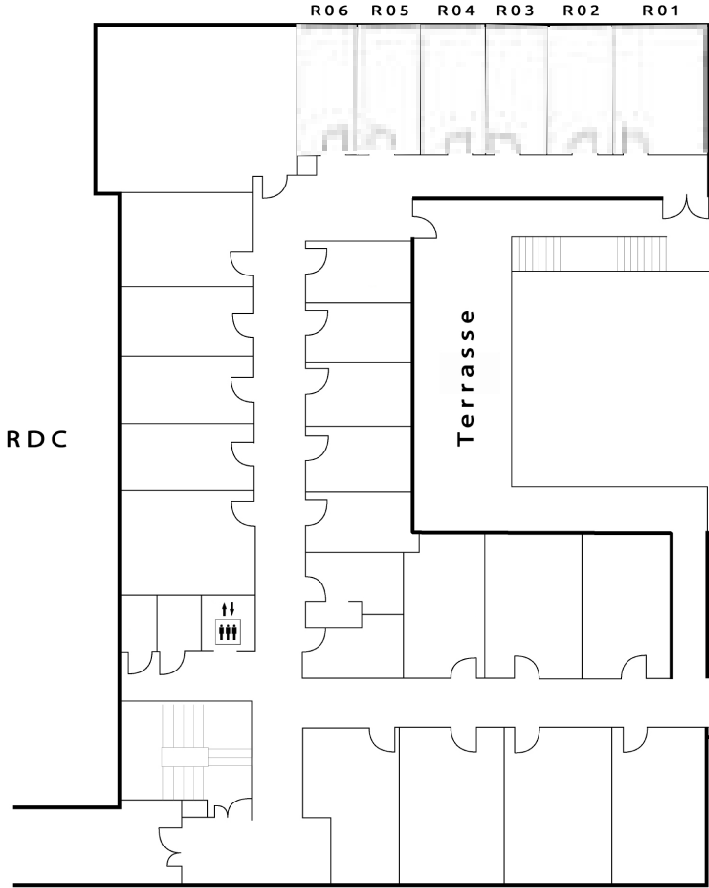


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Octobre						
			L	M	M	J	V	S	D
A									
Etage 1									
R03									
Elec + Equipements	09/10/2020 08:00	13/10/2020 16:00							
R04									
Plomberie/Sanitaires	09/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
Elec + Equipements	13/10/2020 08:00	15/10/2020 16:00							
R05									
Pose des Revêtements au sol	12/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	13/10/2020 08:00	14/10/2020 16:00							
Elec + Equipements	15/10/2020 08:00	19/10/2020 16:00							
R06									
Peinture	12/10/2020 08:00	13/10/2020 16:00							
Pose des Revêtements au sol	14/10/2020 08:00	14/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	15/10/2020 08:00	16/10/2020 16:00							
B									
Etage 1									
Suite 01									
Plomberie/Sanitaires	09/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
Elec + Equipements	13/10/2020 08:00	15/10/2020 16:00							
Suite 07									
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	09/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
Suite 02									
Pose des Revêtements au sol	12/10/2020 08:00	12/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	13/10/2020 08:00	14/10/2020 16:00							
Elec + Equipements	15/10/2020 08:00	19/10/2020 16:00							
Suite 03									
Peinture	12/10/2020 08:00	13/10/2020 16:00							
Pose des Revêtements au sol	14/10/2020 08:00	14/10/2020 16:00							
Plomberie/Sanitaires	15/10/2020 08:00	16/10/2020 16:00							
Suite 04									
Reprise des murs	12/10/2020 08:00	13/10/2020 16:00							
Peinture	14/10/2020 08:00	15/10/2020 16:00							
Pose des Revêtements au sol	16/10/2020 08:00	16/10/2020 16:00							
Suite 08									
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	13/10/2020 08:00	14/10/2020 16:00							
Suite 09									
Reprise des murs	14/10/2020 08:00	15/10/2020 16:00							
Peinture	16/10/2020 08:00	19/10/2020 16:00							
Suite 09									
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	15/10/2020 08:00	16/10/2020 16:00							
Suite 06									
Reprise des murs	16/10/2020 08:00	19/10/2020 16:00							

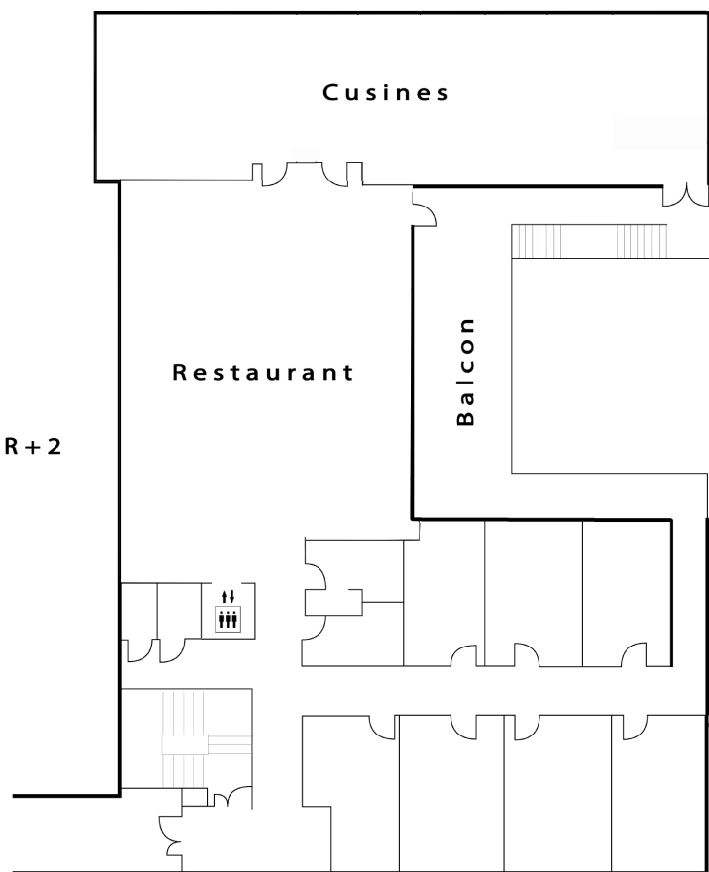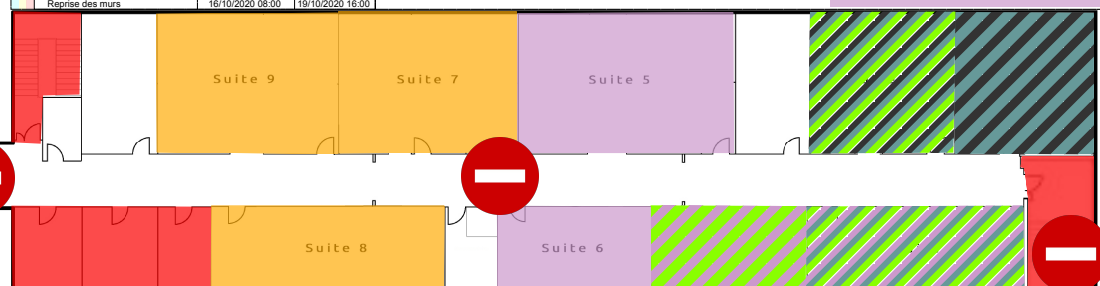


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020						
			Octobre						
			L	M	M	J	V	S	D

2020				2020				2020			
Septembre		Octobre		Octobre		Novembre		Novembre		Novembre	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48


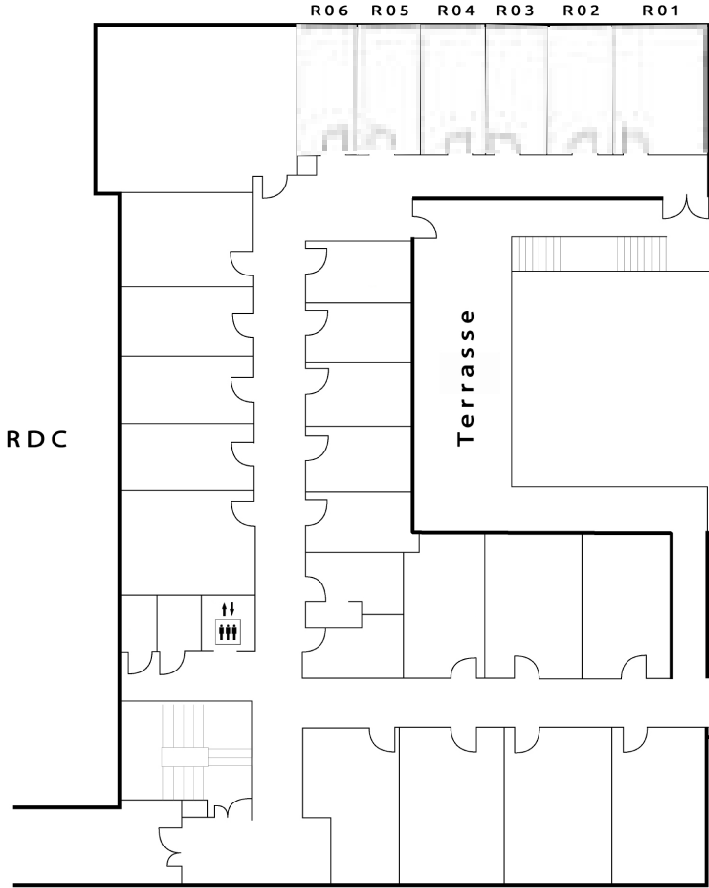


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020								
			L	M	M	J	V	S	D		
Etage 0											
R01											
Dépose Mobilier + moquette	21/10/2020 08.00	21/10/2020 16.00									
Reprise des murs	22/10/2020 08.00	23/10/2020 16.00									
R02											
Dépose Mobilier + moquette	22/10/2020 08.00	22/10/2020 16.00									
Reprise des murs	23/10/2020 08.00	26/10/2020 16.00									
R03											
Dépose Mobilier + moquette	23/10/2020 08.00	23/10/2020 16.00									

01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN

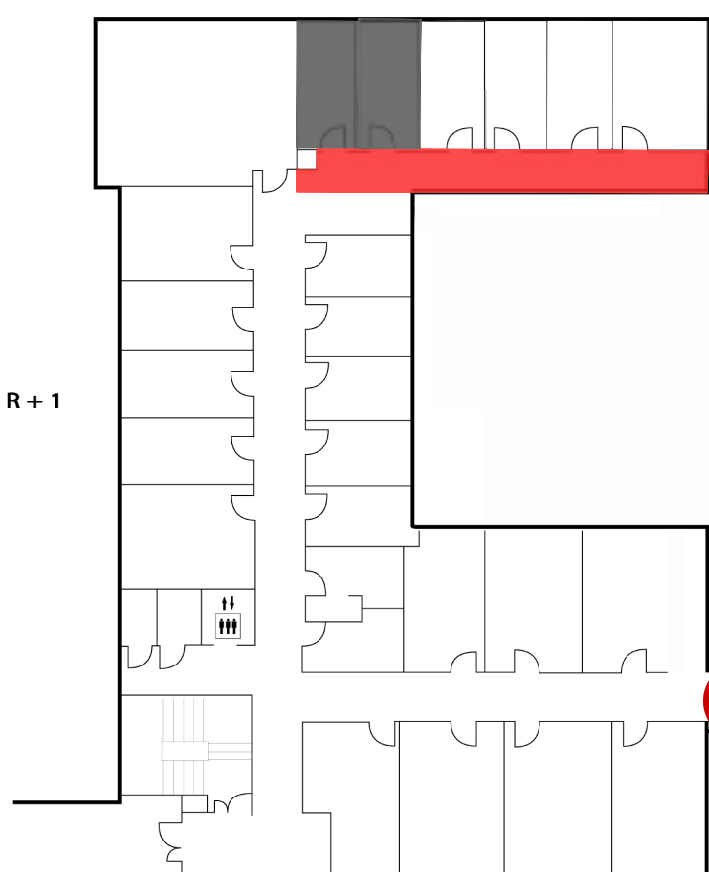


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020							
			L	M	M	J	V	S	D	
Etage 1										
R05										
Elec + Equipements	15/10/2020 08.00	19/10/2020 16.00								
R06										
Elec + Equipements	19/10/2020 08.00	21/10/2020 16.00								
Suite 02										
Elec + Equipements	15/10/2020 08.00	19/10/2020 16.00								
Suite 05										
Peinture	16/10/2020 08.00	19/10/2020 16.00								
Pose des Revêtements au sol	20/10/2020 08.00	20/10/2020 16.00								
Plomberie/Sanitaires	21/10/2020 08.00	22/10/2020 16.00								
Elec + Equipements	23/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00								
Suite 06										
Reprise des murs	16/10/2020 08.00	19/10/2020 16.00								
Peinture	20/10/2020 08.00	21/10/2020 16.00								
Pose des Revêtements au sol	22/10/2020 08.00	22/10/2020 16.00								
Plomberie/Sanitaires	23/10/2020 08.00	26/10/2020 16.00								
Suite 03										
Elec + Equipements	19/10/2020 08.00	21/10/2020 16.00								
Suite 04										
Plomberie/Sanitaires	19/10/2020 08.00	20/10/2020 16.00								
Elec + Equipements	21/10/2020 08.00	23/10/2020 16.00								
Suite 10										
Dépose Cloisons + Mobilier + moquette	19/10/2020 08.00	20/10/2020 16.00								
Suite 07										
Reprise des murs	20/10/2020 08.00	21/10/2020 16.00								
Peinture	22/10/2020 08.00	23/10/2020 16.00								
Suite 08										
Reprise des murs	22/10/2020 08.00	23/10/2020 16.00								

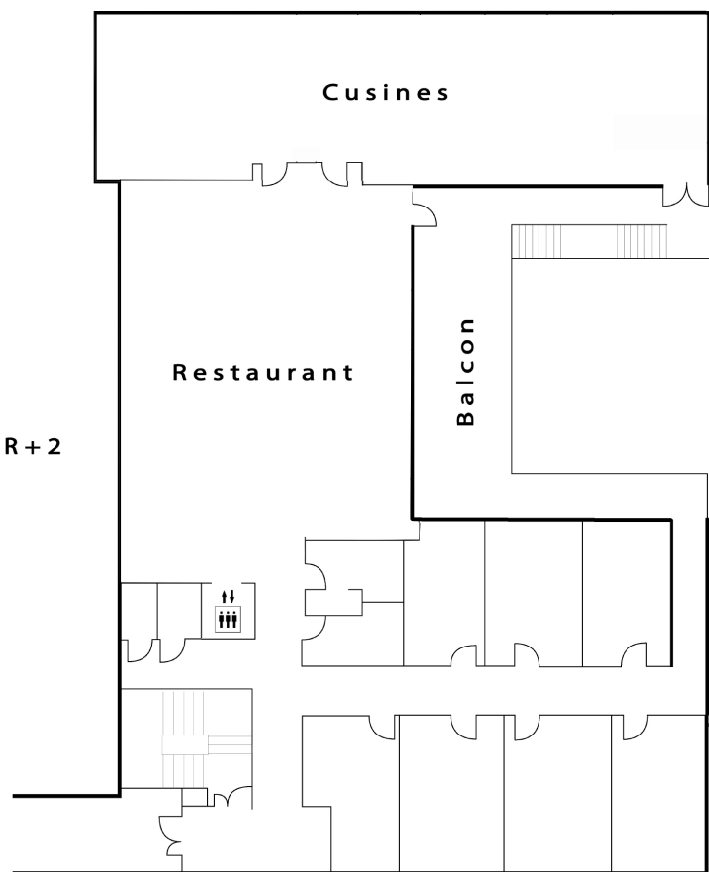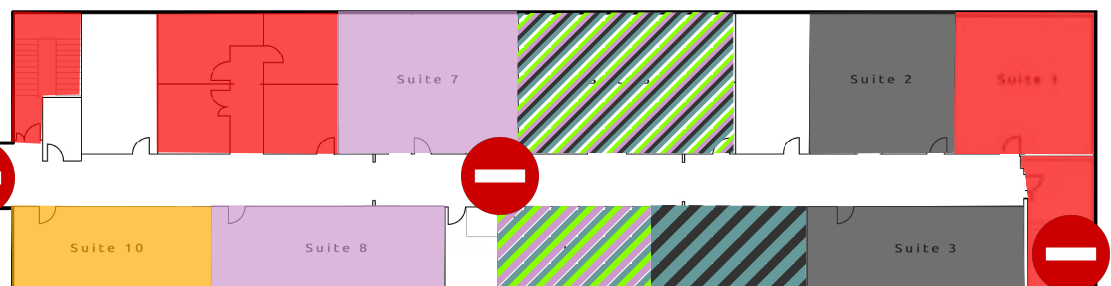



Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020							
			L	M	M	J	V	S	D	

		2020				2020				2020																																								
		Septembre		Octobre		Octobre		Novembre		Novembre		Novembre																																						
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																																							
		<table border="1"> <tr> <td colspan="12">2020</td> </tr> <tr> <td colspan="12">44</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>V</td> <td>S</td> <td>D</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>												2020												44												L	M	M	J	V	S	D						
2020																																																		
44																																																		
L	M	M	J	V	S	D																																												
		<table border="1"> <tr> <td colspan="12">2020</td> </tr> <tr> <td colspan="12">44</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>V</td> <td>S</td> <td>D</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>												2020												44												L	M	M	J	V	S	D						
2020																																																		
44																																																		
L	M	M	J	V	S	D																																												
		<table border="1"> <tr> <td colspan="12">2020</td> </tr> <tr> <td colspan="12">44</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>V</td> <td>S</td> <td>D</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>												2020												44												L	M	M	J	V	S	D						
2020																																																		
44																																																		
L	M	M	J	V	S	D																																												



01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN

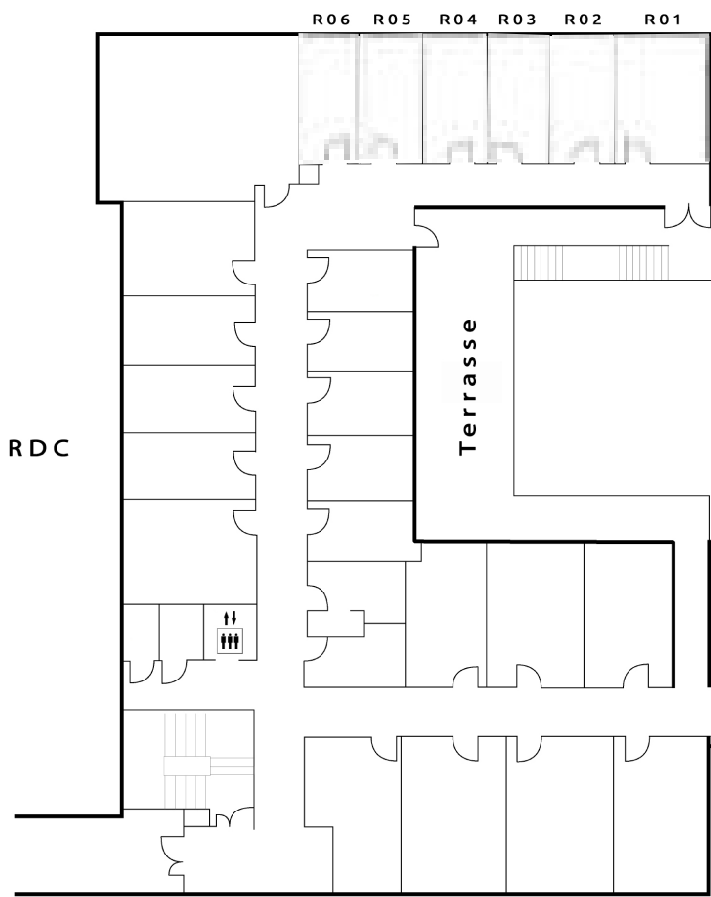

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020											
			Octobre				Octobre				Novembre			
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
Etage 0														
R02														
Reprise des murs	23/10/2020 08.00	26/10/2020 16.00	Reprise des murs											
Peinture	27/10/2020 08.00	28/10/2020 16.00	Peinture											
Pose des Revêtements au sol	29/10/2020 08.00	29/10/2020 16.00	Pose des Revêtements au sol											
Plomberie/Sanitaires	30/10/2020 08.00	02/11/2020 16.00	Plomberie/Sanitaires											
R01														
Peinture	26/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00	Peinture											
Pose des Revêtements au sol	28/10/2020 08.00	28/10/2020 16.00	Pose des Revêtements au sol											
Plomberie/Sanitaires	29/10/2020 08.00	30/10/2020 16.00	Plomberie/Sanitaires											
R03														
Reprise des murs	26/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00	Reprise des murs											
Peinture	28/10/2020 08.00	29/10/2020 16.00	Peinture											
Pose des Revêtements au sol	30/10/2020 08.00	30/10/2020 16.00	Pose des Revêtements au sol											
R04														
Dépose Mobilier + moquette	26/10/2020 08.00	26/10/2020 16.00	Dépose Mobilier + moquette											
Reprise des murs	27/10/2020 08.00	28/10/2020 16.00	Reprise des murs											
Peinture	29/10/2020 08.00	30/10/2020 16.00	Peinture											
R05														
Dépose Mobilier + moquette	27/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00	Dépose Mobilier + moquette											
Reprise des murs	28/10/2020 08.00	29/10/2020 16.00	Reprise des murs											
Peinture	30/10/2020 08.00	02/11/2020 16.00	Peinture											

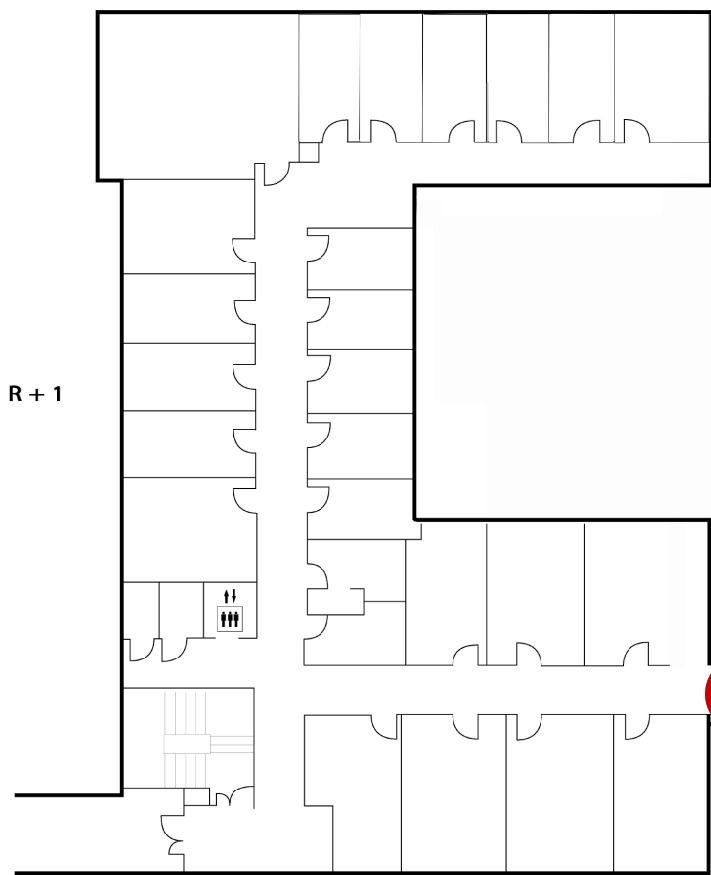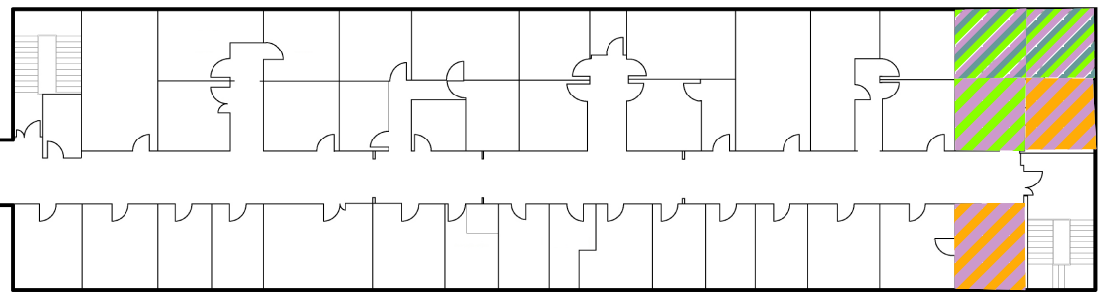


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020											
			Octobre				Octobre				Novembre			
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
Etage 1														
Suite 05														
Elec + Equipements	23/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00	Elec + Equipements											
Suite 06														
Plomberie/Sanitaires	23/10/2020 08.00	26/10/2020 16.00	Plomberie/Sanitaires											
Elec + Equipements	27/10/2020 08.00	29/10/2020 16.00	Elec + Equipements											
Suite 07														
Pose des Revêtements au sol	26/10/2020 08.00	26/10/2020 16.00	Pose des Revêtements au sol											
Plomberie/Sanitaires	27/10/2020 08.00	28/10/2020 16.00	Plomberie/Sanitaires											
Elec + Equipements	29/10/2020 08.00	02/11/2020 16.00	Elec + Equipements											
Suite 08														
Peinture	26/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00	Peinture											
Pose des Revêtements au sol	28/10/2020 08.00	28/10/2020 16.00	Pose des Revêtements au sol											
Plomberie/Sanitaires	29/10/2020 08.00	30/10/2020 16.00	Plomberie/Sanitaires											
Suite 09														
Reprise des murs	26/10/2020 08.00	27/10/2020 16.00	Reprise des murs											
Peinture	28/10/2020 08.00	29/10/2020 16.00	Peinture											
Pose des Revêtements au sol	30/10/2020 08.00	30/10/2020 16.00	Pose des Revêtements au sol											
Suite 10														
Reprise des murs	28/10/2020 08.00	29/10/2020 16.00	Reprise des murs											
Peinture	30/10/2020 08.00	02/11/2020 16.00	Peinture											

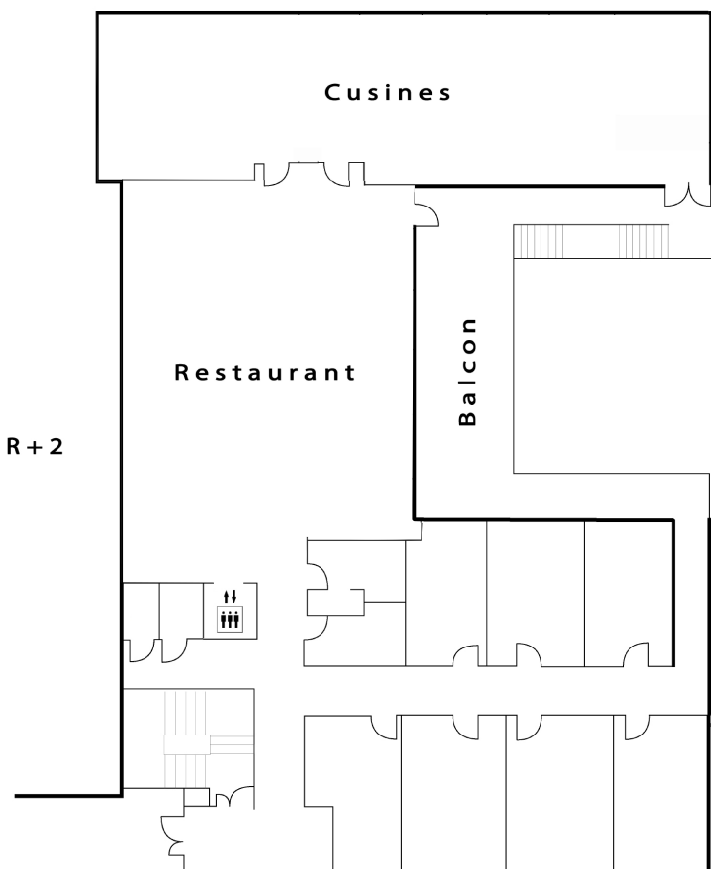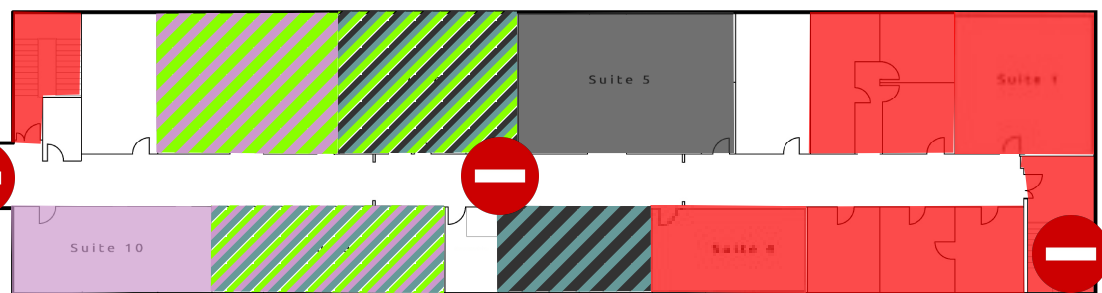


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020											
			Octobre				Octobre				Novembre			
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
Etage 2														
R01														
R02														
R03														
R04														
R05														
R06														

2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Septembre				Octobre				Novembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <th>Nom (PM)</th> <th>Début (PM)</th> <th>Fin (PM)</th> <th colspan="12">2020</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th colspan="12">Novembre</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th colspan="12">45</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th>L</th><th>M</th><th>M</th><th>J</th><th>V</th><th>S</th><th>D</th> <th colspan="5"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="3">R</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">01 - Dépose Mobilier + moquette</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Etage 0</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">02 - Plâtre + Ponçage</td> </tr> <tr> <td colspan="3">R02</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">03 - Peinture</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Plomberie/Sanitaires</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">04 - Revêtements au sol</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Elec + Equipements</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">05 - Plomberie/Sanitaires</td> </tr> <tr> <td colspan="3">R05</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">06 - Elec + Equipements</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Peinture</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2">MIN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pose des Revêtements au sol</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Plomberie/Sanitaires</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Elec + Equipements</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">R01</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Elec + Equipements</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">R03</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Plomberie/Sanitaires</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Elec + Equipements</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">R04</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pose des Revêtements au sol</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Plomberie/Sanitaires</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Elec + Equipements</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020															Novembre															45															L	M	M	J	V	S	D								R															01 - Dépose Mobilier + moquette		Etage 0															02 - Plâtre + Ponçage		R02															03 - Peinture		Plomberie/Sanitaires															04 - Revêtements au sol		Elec + Equipements															05 - Plomberie/Sanitaires		R05															06 - Elec + Equipements		Peinture															MIN		Pose des Revêtements au sol																	Plomberie/Sanitaires																	Elec + Equipements																	R01																	Elec + Equipements																	R03																	Plomberie/Sanitaires																	Elec + Equipements																	R04																	Pose des Revêtements au sol																	Plomberie/Sanitaires																	Elec + Equipements																
Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Novembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			L	M	M	J	V	S	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
R															01 - Dépose Mobilier + moquette																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Etage 0															02 - Plâtre + Ponçage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R02															03 - Peinture																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Plomberie/Sanitaires															04 - Revêtements au sol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Elec + Equipements															05 - Plomberie/Sanitaires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
R05															06 - Elec + Equipements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Peinture															MIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pose des Revêtements au sol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Plomberie/Sanitaires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elec + Equipements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
R01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elec + Equipements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
R03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Plomberie/Sanitaires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elec + Equipements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
R04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pose des Revêtements au sol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Plomberie/Sanitaires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elec + Equipements																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												


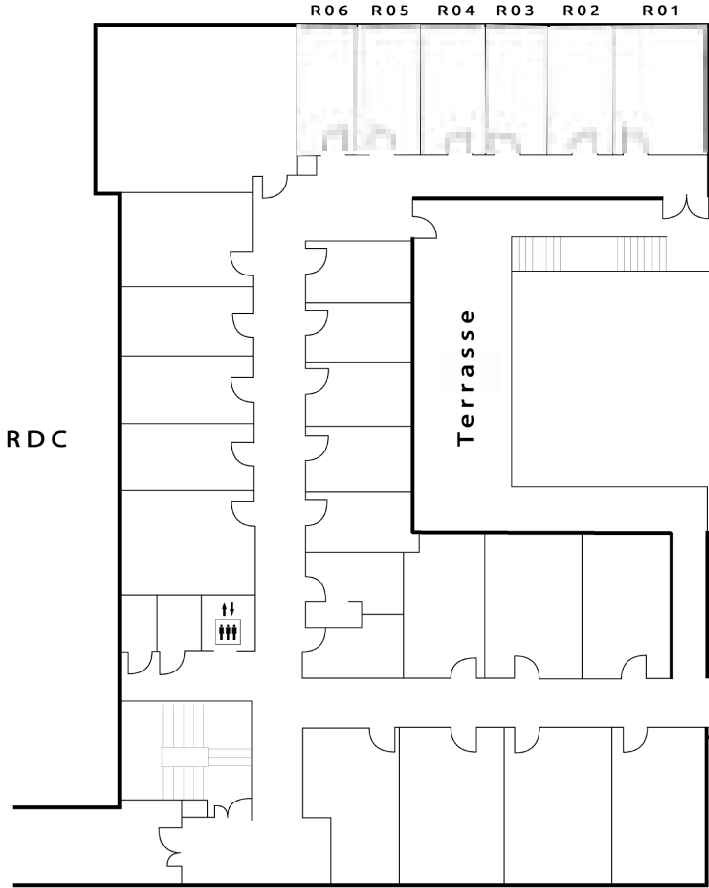


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020													
			Novembre													
			45													
			L	M	M	J	V	S	D							
R															01 - Dépose Mobilier + moquette	
Etage 0															02 - Plâtre + Ponçage	
R02															03 - Peinture	
Plomberie/Sanitaires															04 - Revêtements au sol	
Elec + Equipements															05 - Plomberie/Sanitaires	
R05															06 - Elec + Equipements	
Peinture															MIN	
Pose des Revêtements au sol																
Plomberie/Sanitaires																
Elec + Equipements																
R01																
Elec + Equipements																
R03																
Plomberie/Sanitaires																
Elec + Equipements																
R04																
Pose des Revêtements au sol																
Plomberie/Sanitaires																
Elec + Equipements																

Orange	01 - Dépose Mobilier + moquette
Purple	02 - Plâtre + Ponçage
Green	03 - Peinture
Light Green	04 - Revêtements au sol
Dark Green	05 - Plomberie/Sanitaires
Yellow	06 - Elec + Equipements
White	MIN

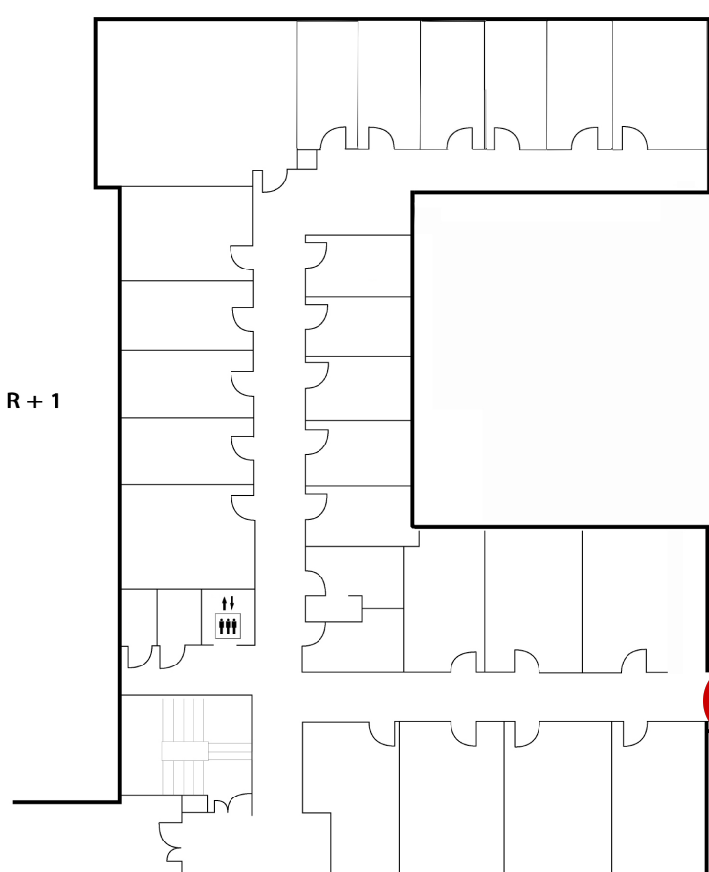


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020													
			Novembre													
			45													
			L	M	M	J	V	S	D							
B															01 - Dépose Mobilier + moquette	
Etage 1															02 - Plâtre + Ponçage	
Suite 07															03 - Peinture	
Elec + Equipements															04 - Revêtements au sol	
Suite 10															05 - Plomberie/Sanitaires	
Peinture															06 - Elec + Equipements	
Pose des Revêtements au sol																
Plomberie/Sanitaires																
Elec + Equipements																
Suite 08																
Elec + Equipements																
Suite 09																
Plomberie/Sanitaires																
Elec + Equipements																

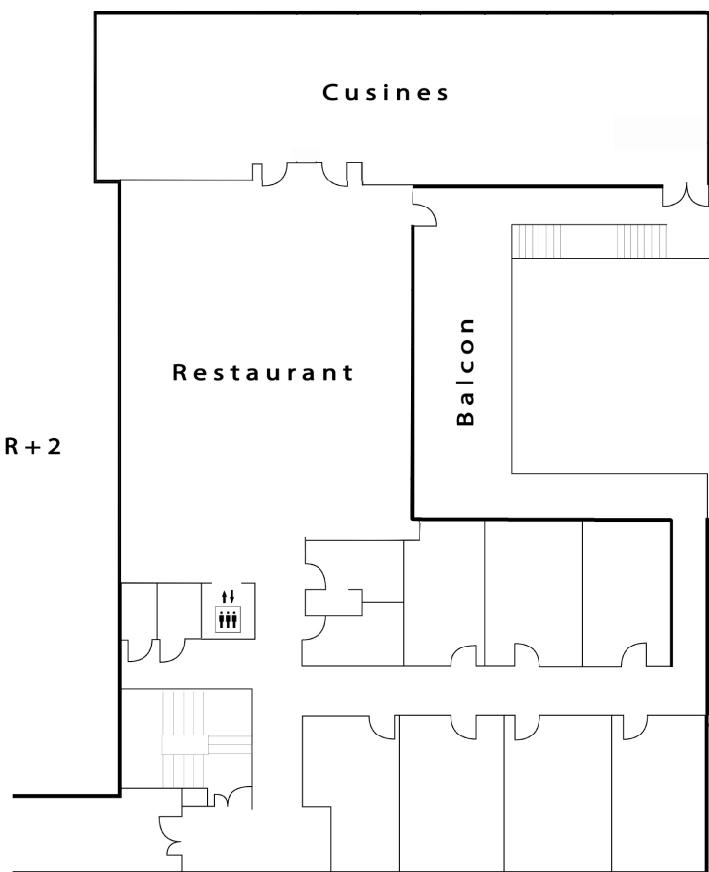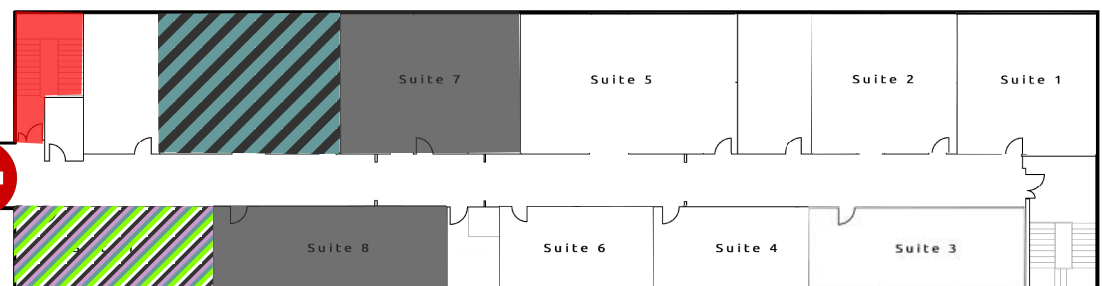


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020													
			Novembre													
			45													
			L	M	M	J	V	S	D							
R															01 - Dépose Mobilier + moquette	
Etage 0															02 - Plâtre + Ponçage	
R02															03 - Peinture	
Plomberie/Sanitaires															04 - Revêtements au sol	
Elec + Equipements															05 - Plomberie/Sanitaires	
R05															06 - Elec + Equipements	
Peinture															MIN	
Pose des Revêtements au sol																
Plomberie/Sanitaires																
Elec + Equipements																

		2020				2020				2020	
		Septembre				Octobre				Novembre	
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2020											
Novembre											
46											
L											
M											
M											
J											
V											
S											
D											
R											
Etage 0											
R04											
Elec + Equipements		05/11/2020 08:00		09/11/2020 16:00							
R05											
Elec + Equipements		06/11/2020 08:00		10/11/2020 16:00							


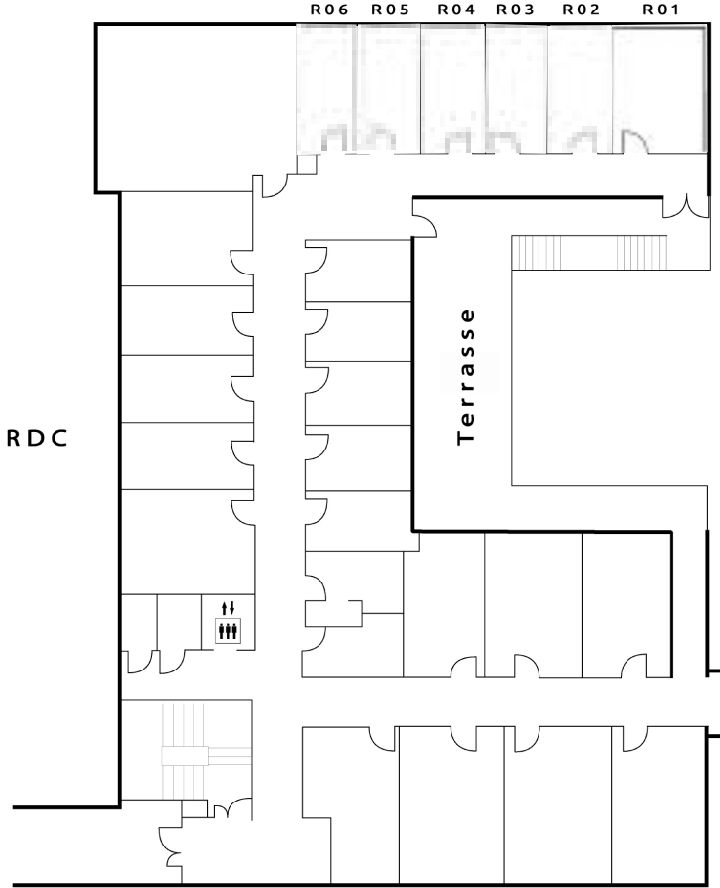


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020											
			Novembre											
			46											
			L	M	M	J	V	S	D					
R														
Etage 0														
R04														
Elec + Equipements	05/11/2020 08:00	09/11/2020 16:00												
R05														
Elec + Equipements	06/11/2020 08:00	10/11/2020 16:00												

01 - Dépose Mobilier + moquette
02 - Plâtre + Ponçage
03 - Peinture
04 - Revêtements au sol
05 - Plomberie/Sanitaires
06 - Elec + Equipements
MIN

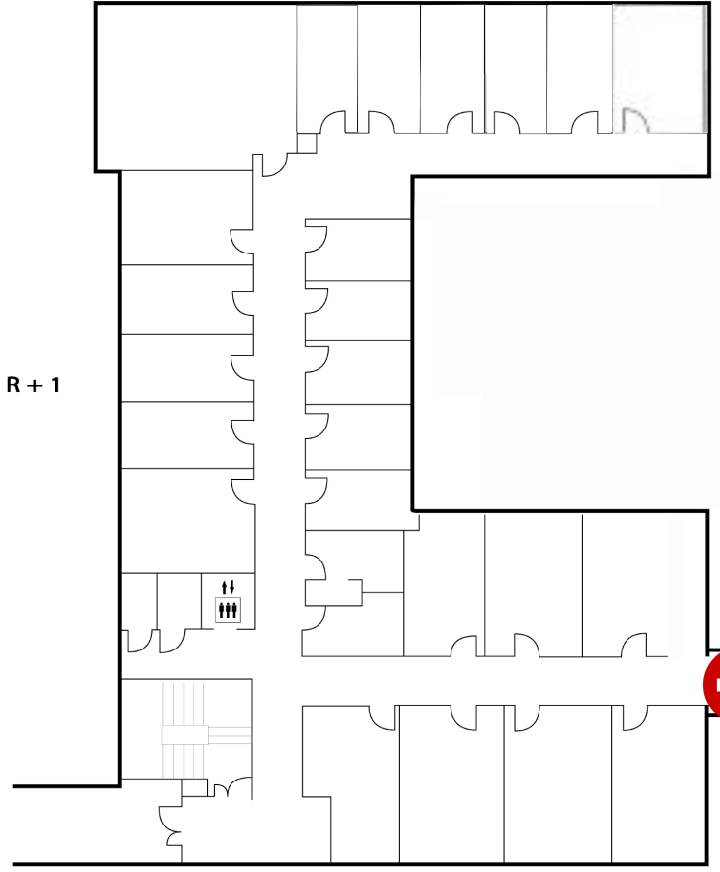

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020											
			Novembre											
			46											
			L	M	M	J	V	S	D					
R														
Etage 1														
Suite 10														
Elec + Equipements	06/11/2020 08:00	10/11/2020 16:00												

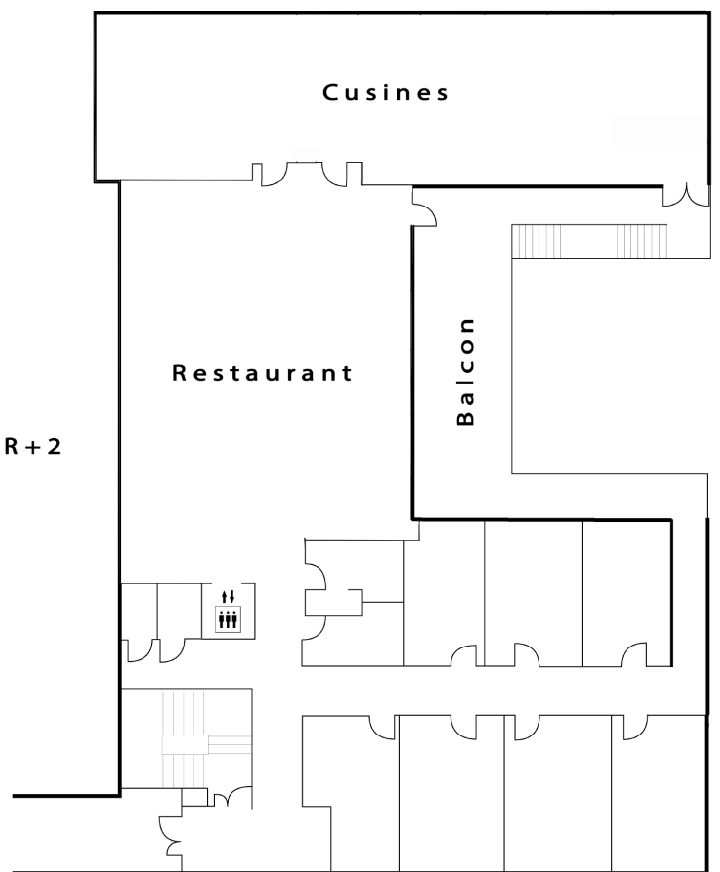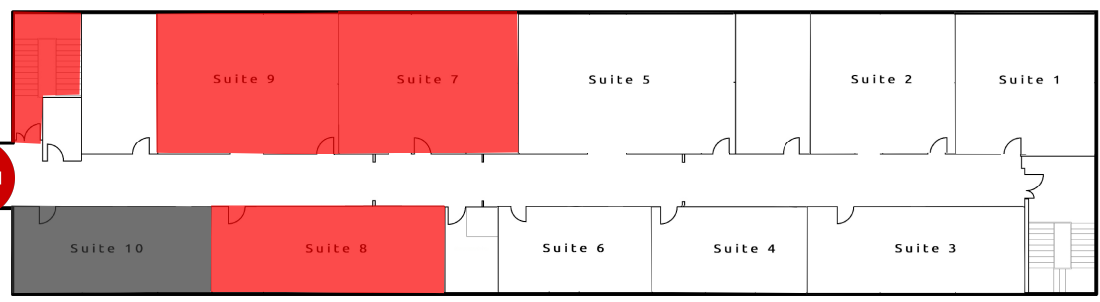

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2020											
			Novembre											
			46											
			L	M	M	J	V	S	D					
